BOQ
+ Project

คู่มือกดตามทีละขั้น
สำหรับผู้ใช้งาน · ระบบ eg-tst
อัปเดตล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2569

งานที่ขายเป็น **โปรเจกต์**: ใส่ระยะเวลาและ Milestone ใน BOQ ตอนยืนยันขายระบบสร้าง Project พร้อม Task ให้ติดตามความคืบหน้า เก็บเงินเป็นงวดตามความคืบหน้า บันทึกค่าแรงติดตั้ง ปิดงานให้ Milestone ถึงเป้า แล้วดูกำไรของโปรเจกต์นั้นที่ P&L ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

[ต้องยืนยัน]

ประเด็นที่ต้องการการยืนยัน

ผู้จัดทำตัดสินใจแทนไปก่อนตามนี้เพื่อให้เส้นทางเดินจนจบได้ ผู้รับผิดชอบฝั่งลูกค้า/บัญชีโปรดยืนยันหรือแจ้งให้ปรับ

ประเด็น	ที่ตัดสินใจไว้
1. ยอดเรียกเก็บงวดแรก (Down Payment) ต้องกรอกรวม VAT	ช่อง Down Payment ที่ใบสั่งขายรับยอดรวม VAT แต่ยอดที่ควรวางบิลของงวดเป็นก่อน VAT (30% ของ 27,360 = 8,208.00) ผมเพิ่มคอลัมน์ ยอดรวม VAT (กรอกในวิซาร์ดเงินดาวน์) ในตารางงวดให้ (8,782.56) พิมพ์ยอดนั้นลงช่อง Down Payment จะได้ใบแจ้งหนี้ก่อน VAT 8,208.00 ตรง (stone_slab_inventory 19.0.2.109.67) ยังต้องพิมพ์เองและต้องเลือกใบแจ้งหนี้ผูกงวดเอง ขอยืนยันว่ายอมรับได้หรืออยากให้ระบบเปิดวิซาร์ดพร้อมยอดให้
2. ช่อง Billed So Far นับยอดก่อน VAT	เดิมนับยอดรวม VAT เทียบกับมูลค่างานก่อน VAT จึงคลาดเคลื่อน (งวดแรกโชว์ 8,208 สำหรับใบแจ้งหนี้ 7,671.03 + VAT) แก้แล้วให้นับก่อน VAT (stone_slab_inventory 19.0.2.109.66) ขอยืนยัน
3. ค่าแรงติดตั้งหน้างาน 1,200 บาทต่อวัน	บริษัท Empire Granite ยังไม่เคยตั้งอัตราค่าแรงติดตั้งต่อวัน และยังไม่มีบัญชี COGS - Site Installation Labor ผมตั้งอัตรา 1,200 ต่อวันและสร้างบัญชี 511140 บน eg-tst เพื่อให้เดินจนจบ ขอยืนยันอัตราและรหัสบัญชีจริง
4. ห้ามใช้ชุดค่าแรงติดตั้งใน BOQ ซ้อนกับการบันทึกค่าแรงติดตั้งที่ Task	ทั้งสองวิธีลงต้นทุนค่าแรงติดตั้งเข้าบัญชีจึงนับซ้ำถ้าใช้ทั้งคู่ เส้นทางนี้ใช้เฉพาะที่ Task (ไม่ใช้ชุดค่าแรง/วัสดุใน BOQ) ขอยืนยันว่าโปรเจกต์ใช้วิธีที่ Task
5. ปุ่ม Tasks ที่ใบสั่งขายนับ Task ที่ผูกกับบรรทัดขายแล้ว	เดิมปุ่มแสดง 0 และรายการว่างทั้งที่มี 2 Task เพราะ Task ของงานหินผูกกับบรรทัดขาย (Origin Sale Line) ไม่ใช่ใบสั่งขายโดยตรง แก้แล้ว (stone_slab_inventory 19.0.2.109.67) ปุ่มนับ 2 และเปิดรายการ Task ทั้งสองได้ ขอยืนยันว่าพอใจ

ประเด็น	ที่ตัดสินใจไว้
6. ค่าบริหารโครงการ 10% (4,104.00) ไม่อยู่ในงวดเก็บเงินของ Task	งวดคิดจากมูลค่างานหิน 27,360 + 13,680 เท่านั้น ค่าบริหารโครงการไปเก็บในใบแจ้งหนี้สุดท้าย ขอยืนยันว่าต้องการแบบนี้
7. Slab ห้ามซ้ำระหว่างใบสั่งผลิตที่ยังไม่เสร็จ	ระบบเลือกให้คนละแผ่น และไม่ให้บันทึกถ้าเลือกซ้ำด้วยมือ (เหมือนเส้นทาง 2 และ 3)

[00]

เตรียมก่อนเริ่ม


เรื่อง	ที่ต้องมี
ระบบ	eg-tst.mx-erp.com · บริษัทมุมขวาบนต้องเป็น **Empire Granite** · ผู้ใช้ต้องเข้าเมนู BOQ Estimation, Sales, Project, Manufacturing, Inventory และ Accounting ได้
สินค้าและหมวด	**ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop** จากตอน 2 ของ คู่มือกดตาม Setup ระบบ · ราคาขาย 3,800 บาทต่อ ตร.ม. · หมวดของสินค้าต้องตั้ง FIFO + Perpetual
ค่าแรงติดตั้งหน้างาน	ตั้ง **อัตราค่าแรงติดตั้งต่อวัน** ที่การตั้งค่าบริษัท (ตัวอย่างนี้ 1,200 บาทต่อวัน) และต้องมีบัญชี **COGS - Site Installation Labor** กับ **Accrued Expenses** ของบริษัท · ถ้ายังไม่มี ปุ่มบันทึกค่าแรงติดตั้งจะแจ้งให้ฝ่ายบัญชีสร้างก่อน
Slab วัตถุดิบ	ต้องมี Slab ของ ZZ2 GUIDE MARBLE ที่ Available อย่างน้อย **3 แผ่น** (แผ่นละ 1.50 × 2.90 × 0.030 ม. = 4.35 ตร.ม.)
ลูกค้า	**Demo Hotel Customer** (มีอยู่ในระบบ)
ข้อมูลตัวอย่าง	2 โซน: **ห้องอาหาร 7.20 ตร.ม.** (ระยะเวลา 5 วัน Milestone "ปูพื้นห้องอาหารเสร็จ") และ **ทางเดิน 3.60 ตร.ม.** (3 วัน "ปูพื้นทางเดินเสร็จ") สินค้า ZZ2 GUIDE MARBLE Countertop ขนาดชิ้น **60 × 120 ซม. หนา 2 ซม.** · ราคา 3,800 ต่อ ตร.ม. · Overhead 10% · ยอดก่อน VAT **45,144.00 บาท**
เลขและรหัส	เลขเอกสาร (BOQ1184, S01748, EG01/STFG/00467, INV/2026/00016 ฯลฯ) เป็นของรอบที่ทดสอบไว้ ของคุณจะได้เลขใหม่ ให้ดูตามเลขของคุณเอง · งวดเก็บเงินในคู่มือนี้ 2 งวด: 30% และ 100%

การทำตามคู่มือนี้สร้างข้อมูลจริงในระบบ eg-tst (ไม่ใช่ระบบใช้งานจริง) ไม่ต้องลบทิ้ง · การผลิต ส่งของ และออกใบแจ้งหนี้ตัดสต็อกและลงบัญชีจริงในระบบทดสอบ


[01]

ตอน 1 · BOQ พร้อมระยะเวลาและ Milestone


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
1.1	เปิดแอป **BOQ Estimation** > BOQ Documents กด **New** ช่อง Customer เลือก **Demo Hotel Customer**	เลือกลูกค้าก่อนเพิ่มบรรทัด	ฟอร์ม BOQ ใหม่แถบขั้น ① ประเมินพื้นที่ → ② ค่าแรง + วัสดุสิ้นเปลือง → ③ Cut List → ④ ออกใบเสนอราคาแล้ว
1.2	กดไอคอนตัวเลือกคอลัมน์ที่หัวตาราง ติ๊ก **กว้าง (ซม.) ยาว (ซม.) หนา (ซม.) Duration (days) Milestone** และ **Milestone Name**	ระยะเวลาและ Milestone เป็นสิ่งที่ทำให้ระบบวางแผน Task ให้ตอนขาย · คอลัมน์พวกนี้ซ่อนไว้ตั้งต้น	หัวตารางมีคอลัมน์ขนาด Duration Milestone และ Milestone Name เพิ่ม
1.3	กด **Add a line** แล้วคลิกทีละช่องและพิมพ์: โซน **ห้องอาหาร** · รายละเอียด **เคาน์เตอร์ห้องอาหาร หินขาว ขัดมัน** · สินค้า **ZZ2G-FG** · ปริมาณ **7.2** · กว้าง **60** · ยาว **120** · หนา **2** · Duration **5** · ติ๊ก Milestone · Milestone Name **ปูพื้นห้องอาหารเสร็จ** จากนั้นทำซ้ำอีกบรรทัด: **ทางเดิน** · **เคาน์เตอร์ทางเดิน หินขาว ขัดมัน** · **3.6** · 60 × 120 × 2 · Duration **3** · Milestone **ปูพื้นทางเดินเสร็จ**	โซนคือกลุ่มงานที่ใบเสนอราคาและ Task แยกตาม · Duration คือวันที่ใช้ทำงานนั้น ระบบใช้วางวันเริ่ม-จบของ Task · Milestone คือหมุดหมายที่จะ "ถึง" เมื่อปิด Task · ขนาดชิ้น 60 × 120 ซม. ทำให้ระบบแตกรายชิ้นเอง (7.20 ÷ 0.72 = 10 ชิ้น · 3.60 ÷ 0.72 = 5 ชิ้น)	เลือกสินค้าแล้วระบบใส่ หน่วย m² และวัสดุ/หน่วย 3,800.00 · ห้องอาหาร: ราคา/หน่วย 3,800.00 · Overhead 10.00 · รวม **27,360.00** · ทางเดิน: รวม **13,680.00**
1.4	กด **Save** แล้วดูยอดรวมล่างขวา	ตรวจยอดก่อนออกใบเสนอราคา	Amount Direct Cost **41,040.00** · Overhead & Profit 4,104.00 · Amount Total **45,144.00** · ได้เลข BOQ (เช่น BOQ1184)

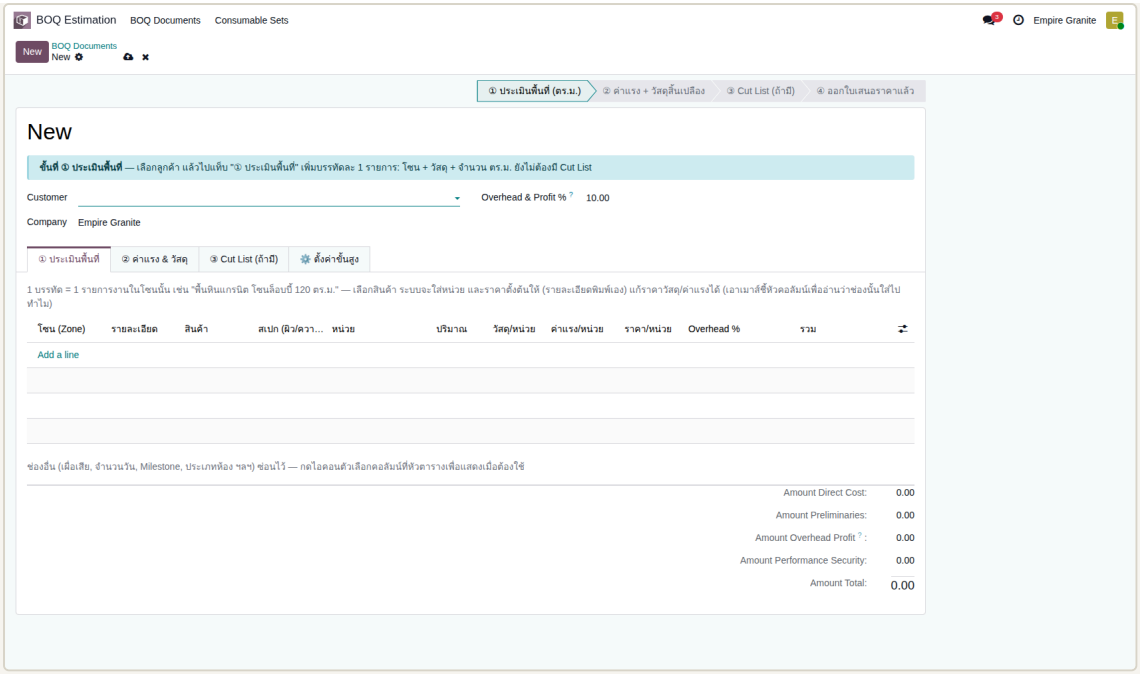

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ฟอร์ม BOQ ใหม่ (ข้อ 1.1)

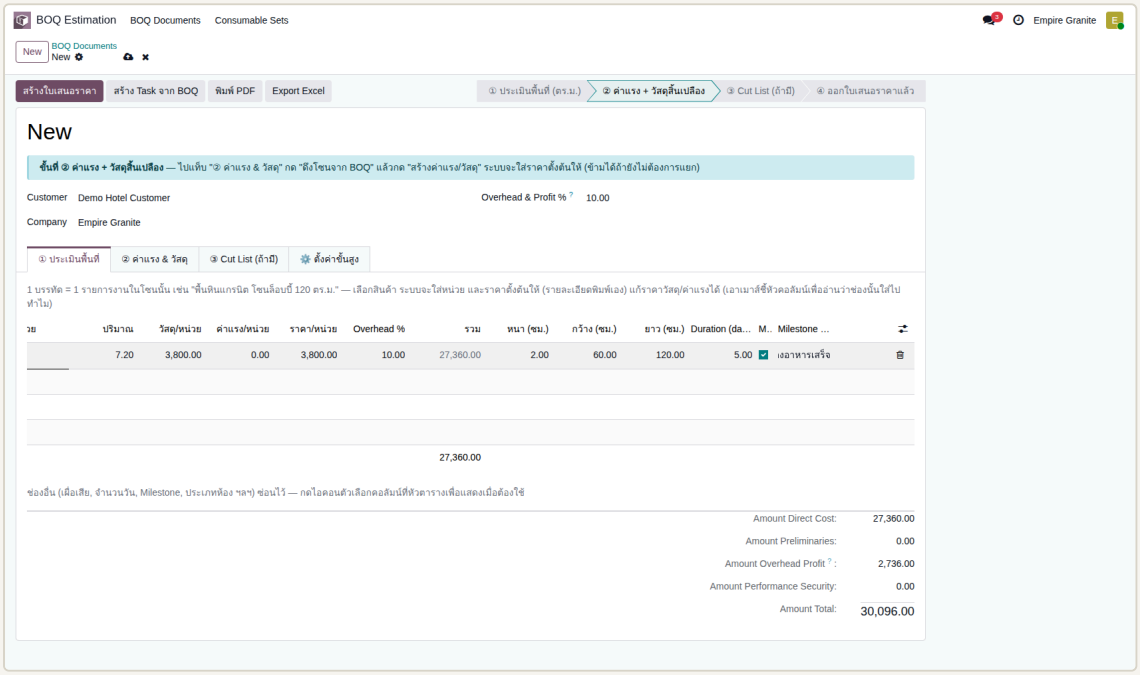

ตัวอย่างหน้าจอจริง: บรรทัดแรกที่กรอกครบพร้อม Duration และ Milestone (ข้อ 1.3)

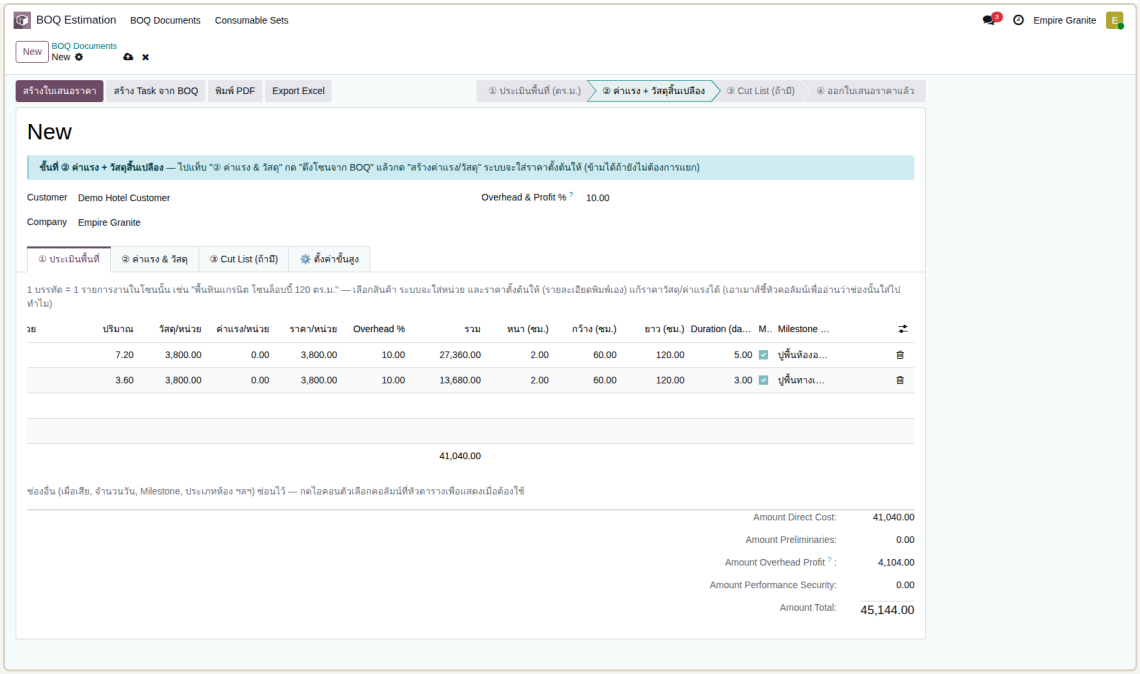


ตัวอย่างหน้าจอจริง: สองโซนในแท็บ ① (ข้อ 1.3)


[02]

ตอน 2 · ใบเสนอราคา ติ๊ก Sold as Project และยืนยัน


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.1	ที่ BOQ กด **สร้างใบเสนอราคา**	ใบเสนอราคาสร้างจาก BOQ โดยตรง ขนาด ราคา โซน และระยะเวลาติดมาให้ ไม่ต้องกรอกซ้ำ	ใบเสนอราคา (เช่น S01748) ช่อง BOQ Document ชี้ BOQ1184 · จัดเป็นหมวดตามโซน ห้องอาหาร 7.200 m² × 3,800.00 ขนาด **60 × 120 ซม. × 10 ชิ้น** · ทางเดิน 3.600 m² × 3,800.00 **× 5 ชิ้น** · ค่าบริหารโครงการ 4,104.00 · ก่อน VAT **45,144.00** · รวม VAT **48,304.08**
2.2	ที่ใบเสนอราคา ติ๊กช่อง **Sold as Project** แล้ว Save **ก่อน**กด Confirm	ถ้าไม่ติ๊ก ระบบจะไม่สร้าง Project และ Task ตอนยืนยัน (พบจากการเดินจริง: ใบที่ลืมติ๊กแล้ว Confirm ไม่ได้ Project เลย)	ช่อง Sold as Project มีเครื่องหมายถูก · เกิดช่อง Project และ Link to Existing Project · คอลัมน์ Zone / Schedule ขึ้นในตารางบรรทัด
2.3	กด **Confirm** แล้วรีเฟรชหน้า (F5) ดูปุ่มสมาร์ทด้านบน	ยืนยันการขาย ระบบสร้างใบสั่งผลิตหนึ่งใบต่อโซน และสร้าง Project พร้อม Task หนึ่งใบต่อบรรทัดหิน	ปุ่มสมาร์ท **Projects 1** · **Tasks 2** · Hours Recorded · **Delivery 1** · **FG Production 2** · ยอดเดิม 45,144.00 / 48,304.08

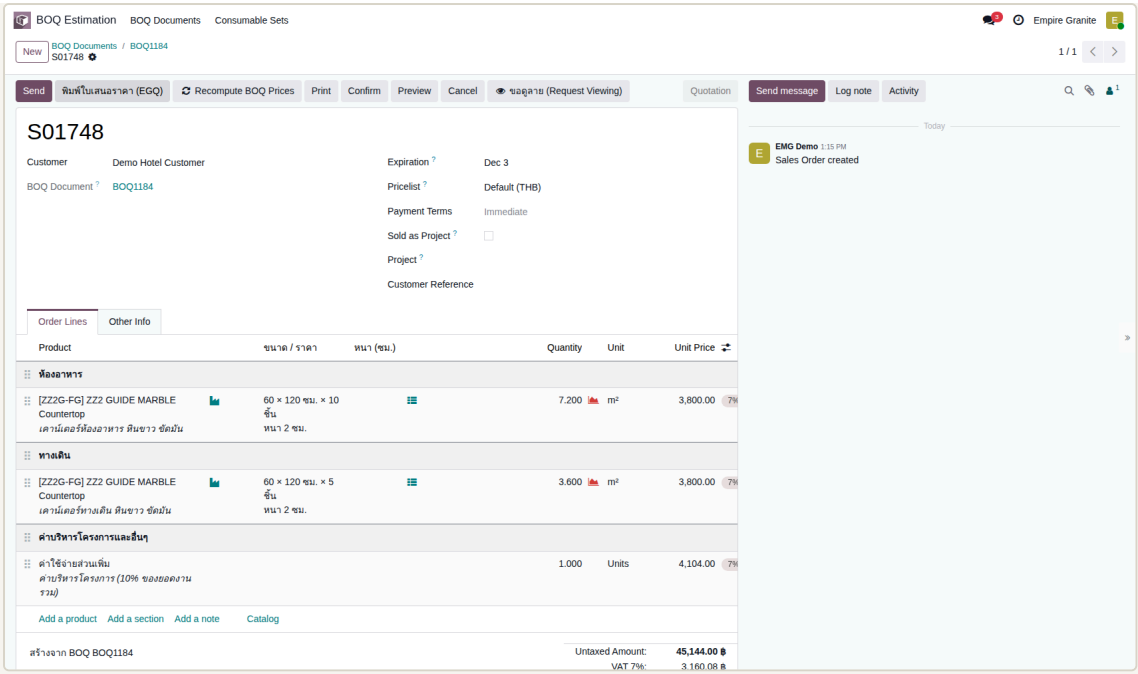

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบเสนอราคาจาก BOQ (ข้อ 2.1)

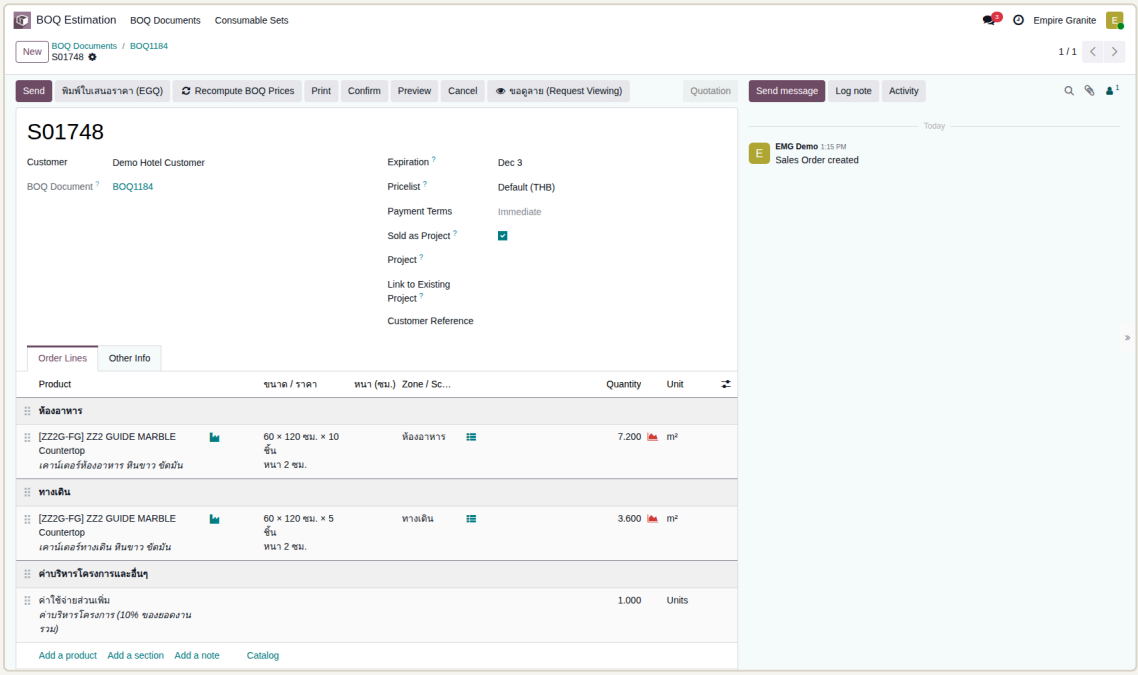

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ติ๊ก Sold as Project ที่ใบเสนอราคา (ข้อ 2.2)

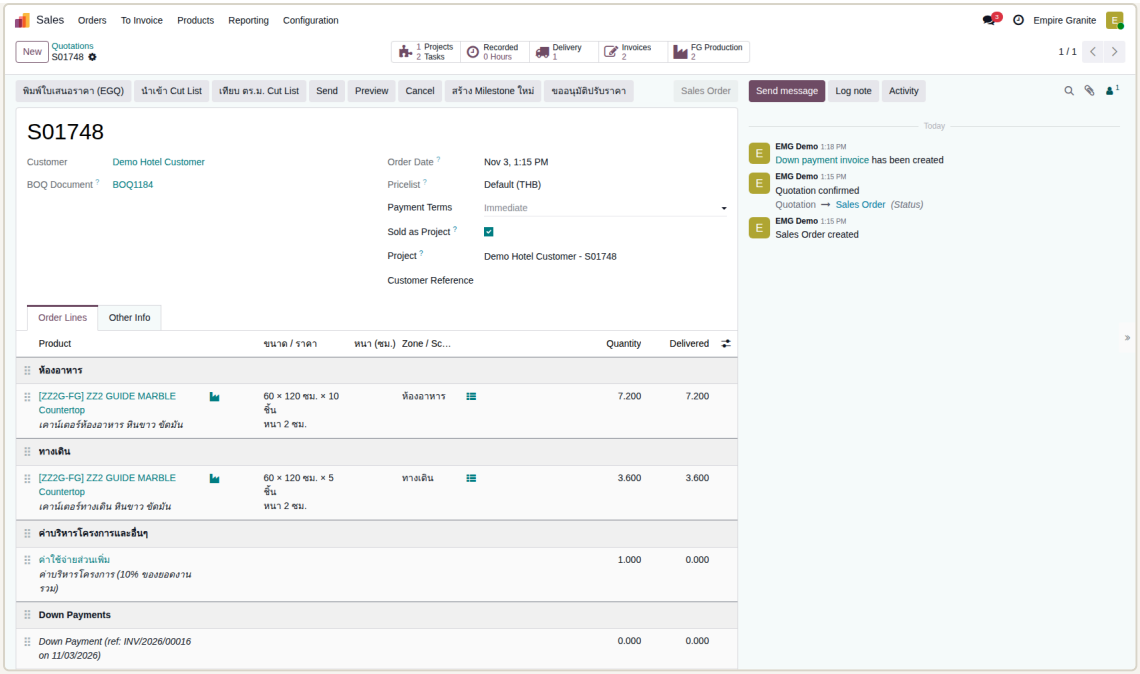

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งขายที่ยืนยันแล้ว มีปุ่ม Projects (ข้อ 2.3)


ปุ่ม **Tasks** ที่ใบสั่งขายนับ Task ที่ผูกกับบรรทัดขายด้วย (เดิมแสดง 0 แก้แล้ว) กดแล้วเปิดรายการ Task ทั้งสองใบ · ภาพนี้ถ่ายหลังจบทั้งเส้นทาง จึงมีปุ่ม Invoices และบรรทัด Down Payments เพิ่มจากตอนยืนยันใหม่ ๆ

[03]


ตอน 3 · Project, Task และงวดเก็บเงิน

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
3.1	เปิดแอป **Project** เลือกโปรเจกต์ **Demo Hotel Customer - S01748** ดูรายการ Task	ระบบตั้งชื่อ Project จากลูกค้าและเลขใบสั่งขาย · แต่ละบรรทัดหินเป็นหนึ่ง Task	2 Task ในคอลัมน์ To Do: **เคาน์เตอร์ห้องอาหาร หินขาว ขัดมัน** และ **เคาน์เตอร์ทางเดิน หินขาว ขัดมัน**
3.2	เปิด Task ห้องอาหาร	ดูว่าข้อมูลจาก BOQ ติดมาครบ ไม่ต้องกรอกซ้ำ	Zone **ห้องอาหาร** · Origin Sale Line ชี้บรรทัดของ S01748 · Origin Sale Line Value **27,360.00** · Progress % 0 · Milestone **ปูพื้นห้องอาหาร เสร็จ** · Planned Date ห่างกัน 5 วัน (ตาม Duration)


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
3.3	ที่ Task ห้องอาหาร ช่อง **Allocated Time** พิมพ์ **10** (ชั่วโมง) แล้วเปิดแท็บ **Billing Stages** กด Add a line สองครั้ง: **งวดที่ 1 (มัดจำ 30%)** Bill at Progress % **30** · **งวดที่ 2 (ส่งมอบ 100%) 100** แล้ว Save	Progress ของ Task = ชั่วโมงที่ลงเวลา ÷ Allocated Time (10 ชั่วโมง = 100%) · งวดเก็บเงินตัดตามความคืบหน้า 30% และ 100%	ช่อง ยอดที่ควรวางบิลงวดนี้: งวด 1 **8,208.00** (30% × 27,360) · งวด 2 **19,152.00** (70% ที่เหลือ) รวม 27,360.00 พอดี · สถานะ ยังไม่ได้ออกบิล ทั้งสองงวด

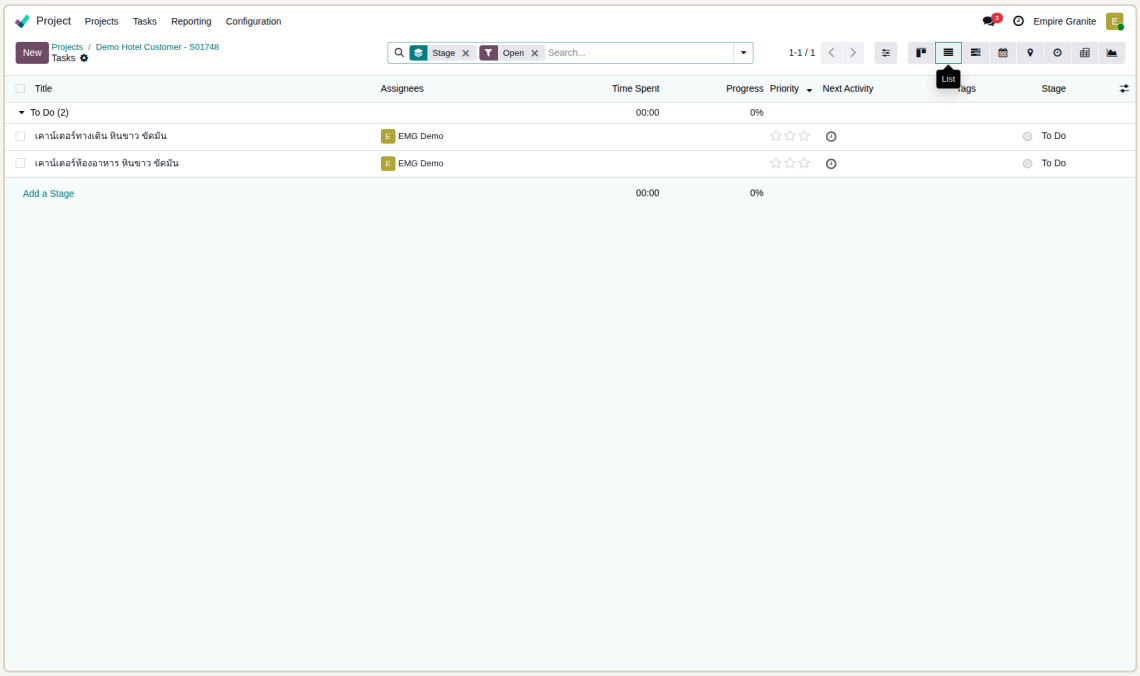

ตัวอย่างหน้าจอจริง: รายการ Task ของโปรเจกต์ (ข้อ 3.1)

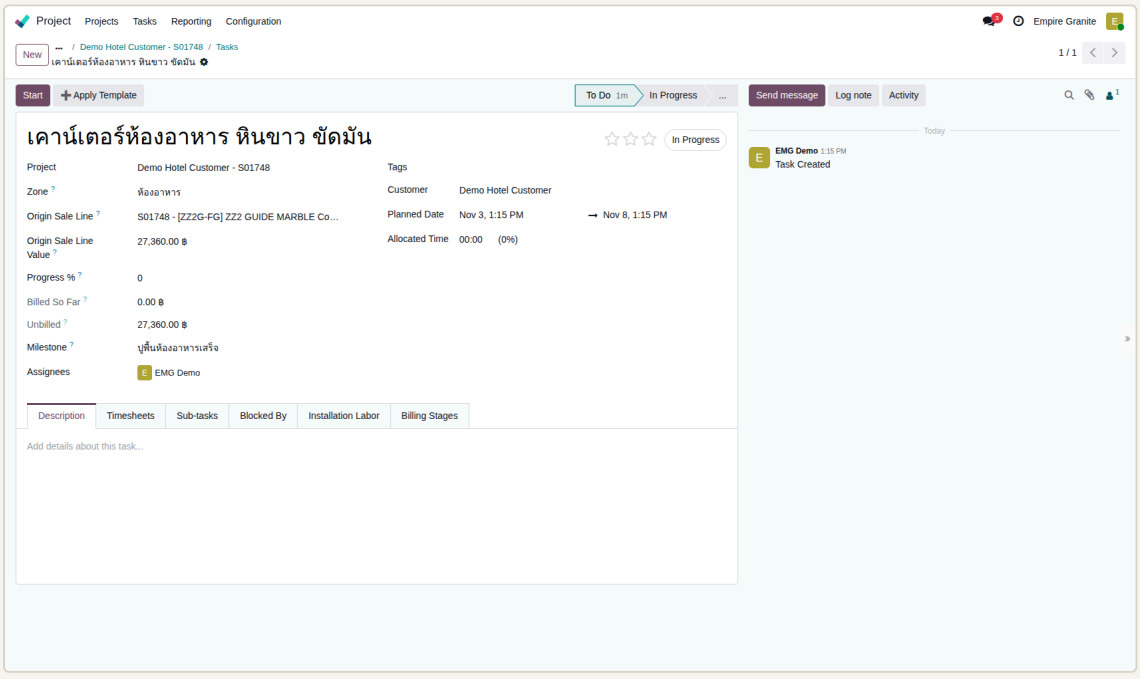

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ฟอร์ม Task ห้องอาหาร (ข้อ 3.2)

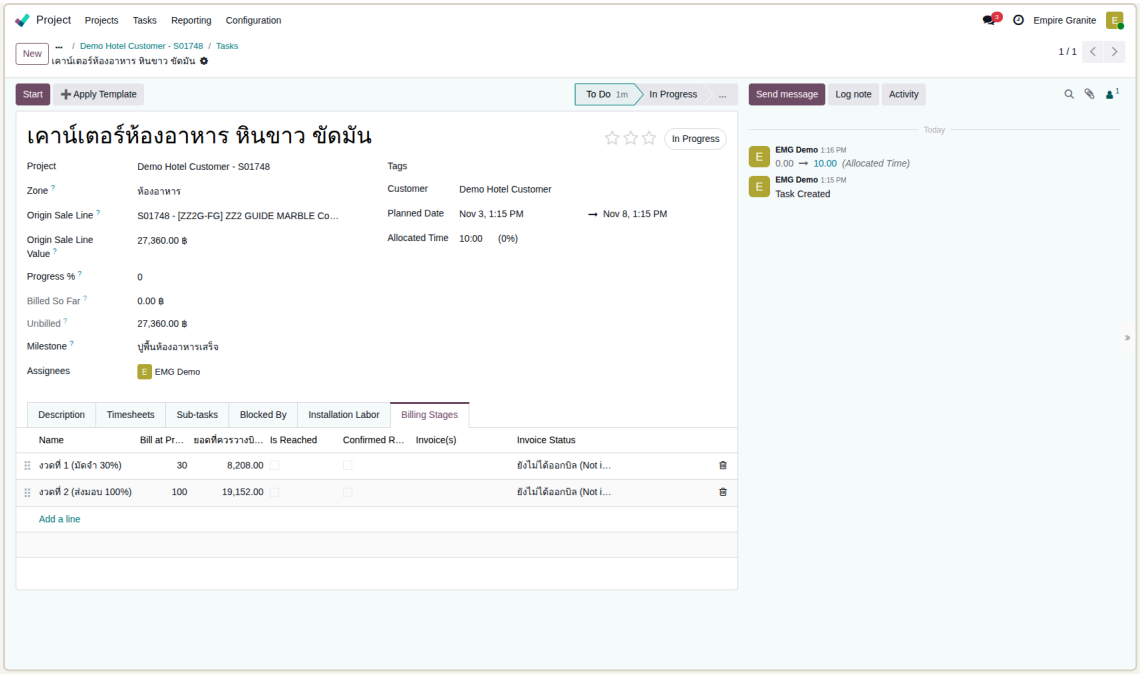


ตัวอย่างหน้าจอจริง: งวดเก็บเงิน 2 งวด (ข้อ 3.3)


[04]

ตอน 4 · ผลิต FG

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.1	ที่ใบสั่งขาย กดสมาร์ทปุ่ม **FG Production** เปิดใบห้องอาหาร (7.20 ตร.ม.) แล้วเปิดแท็บ **Slab ที่จะตัด**	ใบสั่งผลิตคือเอกสารของโรงงาน ขนาดชิ้นจาก BOQ ติดมาแล้ว · ระบบเลือก Slab ให้พอกับพื้นที่ และไม่เลือกซ้ำกับใบสั่งผลิตอีกใบที่ยังเป็น Draft	ใบสั่งผลิต (เช่น EG01/STFG/00467) Draft · แผ่นที่เลือก **BLK-26-1482-35** และ **-36** (8.70 ตร.ม.) · ใบทางเดิน (00468) ได้ **BLK-26-1482-37** คนละแผ่น
4.2	กด **ย้ายไปสถานีตัด → Confirm → ผลิต FG เสร็จ** → รีเฟรชหน้า (F5) ทำทั้งสองใบ	Slab ต้องอยู่ที่สถานีตัดก่อน ระบบจึงจองแผ่นให้งานนี้ได้ · หลังกดปุ่มผลิตเสร็จ หน้าจออาจโชว์สถานะเดิมช่วงสั้นๆ ให้รีเฟรช	สถานะ **Done** ทั้งสองใบ · รายการบัญชี: ค่าแรงโรงงาน FG Production Labor **10,800.00** (7.20 × 1,500) และ **5,400.00** (3.60 × 1,500)

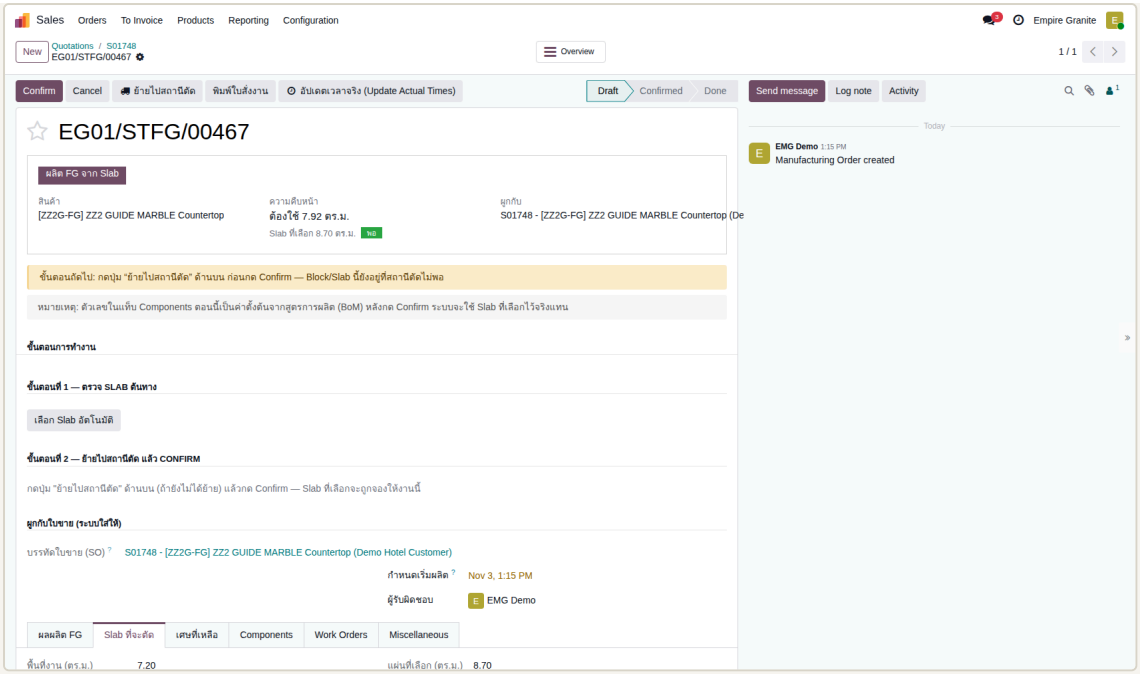

ตัวอย่างหน้าจอจริง: Slab ที่ระบบเลือกให้ใบห้องอาหาร (ข้อ 4.1)

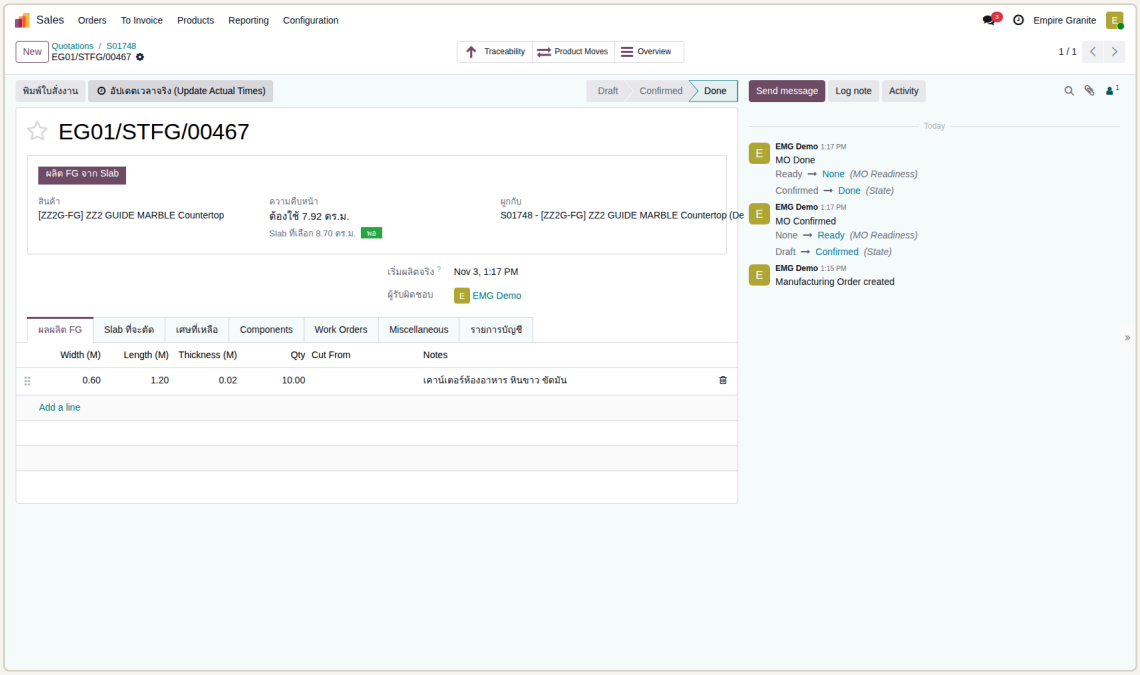


ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งผลิตที่ Done (ข้อ 4.2)


[05]

ตอน 5 · ความคืบหน้า และเก็บเงินงวดแรก


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
5.1	เปิด Task ห้องอาหาร แท็บ **Timesheets** กด Add a line ช่องรายละเอียด **ปูพื้นห้องอาหาร วันที่ 1** · ชั่วโมง **3** แล้ว Save	ชั่วโมงที่ลงทำหน้าที่เป็นคะแนนความคืบหน้า 3 ÷ 10 = 30% (ไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาทำงานจริง) · ช่องพนักงานไม่ต้องกรอก ระบบใส่ให้ตอนบันทึก	Progress % เป็น **30** · Allocated Time 10:00 (30%)
5.2	แท็บ **Billing Stages** ดูงวด 1 แล้วกดปุ่ม **ยืนยันพร้อมเก็บเงิน**	ถึงเกณฑ์ 30% แล้ว ระบบแจ้งผู้จัดการโปรเจกต์ให้พิจารณาวางบิล · การกดยืนยันไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้เอง เป็นแค่การรับทราบ	งวดที่ 1: Is Reached ✓ แล้วหลังกดยืนยัน Confirmed Ready to Bill ✓ และปุ่มหายไป · งวดที่ 2 ยังไม่ถึงเกณฑ์
5.3	ที่ใบสั่งขาย กด **Create Invoice** เลือก **Down payment (fixed amount)** ช่อง Down Payment Amount (Fixed) พิมพ์ **8782.56** แล้วกด Create Draft จากนั้นกด **Confirm**	ช่องนี้รับยอด**รวม VAT** แต่ยอดที่ควรวางบิลของงวดเป็นก่อน VAT ให้ใช้ยอดจากคอลัมน์ **ยอดรวม VAT** ในตารางงวดที่ Task (แท็บ Billing Stages): 8,208.00 บวก VAT 7% = 8,782.56 จะได้ยอดก่อน VAT ตรง 8,208.00	ใบแจ้งหนี้ (เช่น INV/2026/00016) **Posted** · บรรทัด Down Payment · ก่อน VAT **8,208.00** · VAT 574.56 · รวม **8,782.56**
5.4	กลับไปที่ Task ห้องอาหาร แท็บ Billing Stages คลิกช่อง **Invoice(s)** ของงวดที่ 1 เลือกใบแจ้งหนี้ที่เพิ่งออก แล้ว Save	ผูกใบแจ้งหนี้กับงวด ระบบจึงอ่านสถานะจริง (ออกบิลแล้ว จ่ายแล้ว) กลับมาโชว์ที่งวดและที่ยอดสรุปของ Task	งวดที่ 1: สถานะ **ออกบิลแล้ว รอชำระ** · Billed So Far **8,208.00** · Unbilled **19,152.00**
5.5	กลับที่ใบสั่งขาย กดสมาร์ทปุ่ม **Delivery** แล้วกด **Validate** จากนั้นรีเฟรชหน้า	ส่งของที่ผลิตเสร็จ ระบบจองสต็อก FG ให้เอง ไม่ต้องเลือก Lot	ใบส่งของ (เช่น EG01/OUT/00754) Ready ก่อนกด · 2 บรรทัด **7.200** และ **3.600** m² · หลัง Validate **Done**

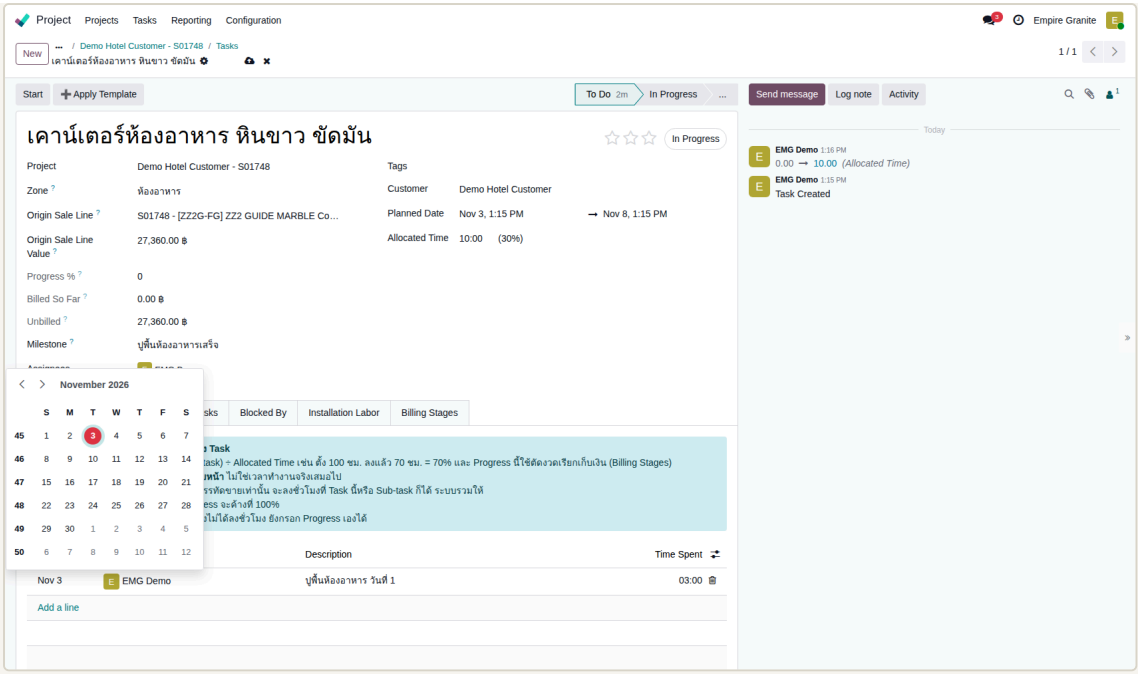


ตัวอย่างหน้าจอจริง: ลงเวลา 3 ชั่วโมง (ข้อ 5.1)

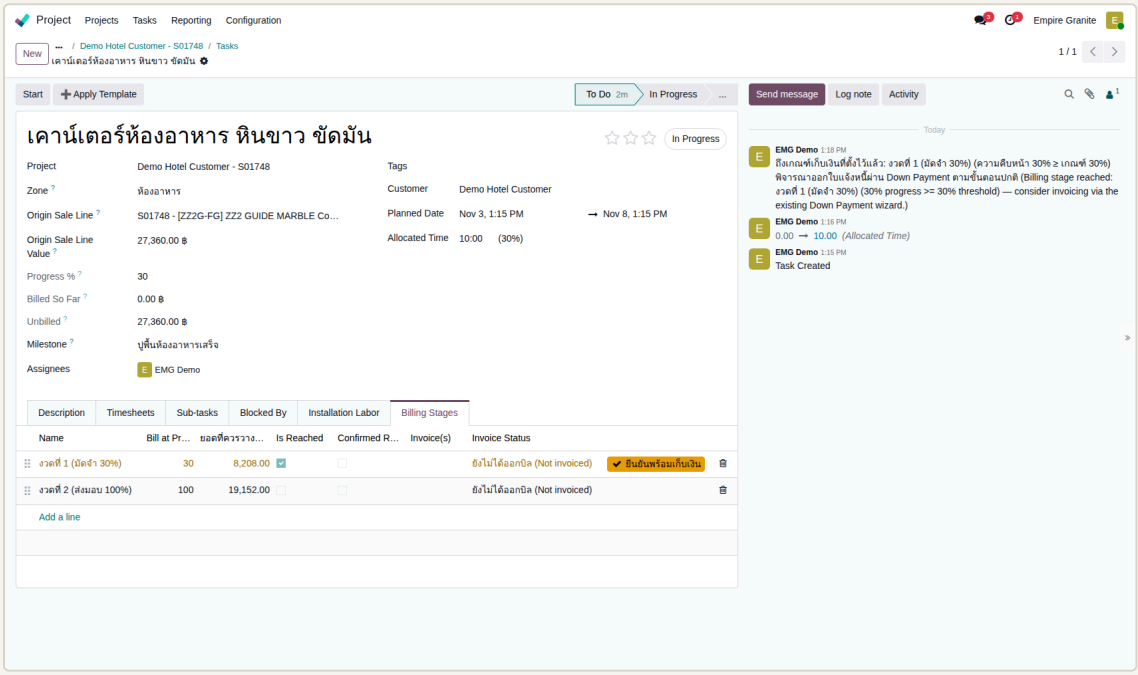


ตัวอย่างหน้าจอจริง: งวดที่ 1 ถึงเกณฑ์ 30% (ข้อ 5.2)

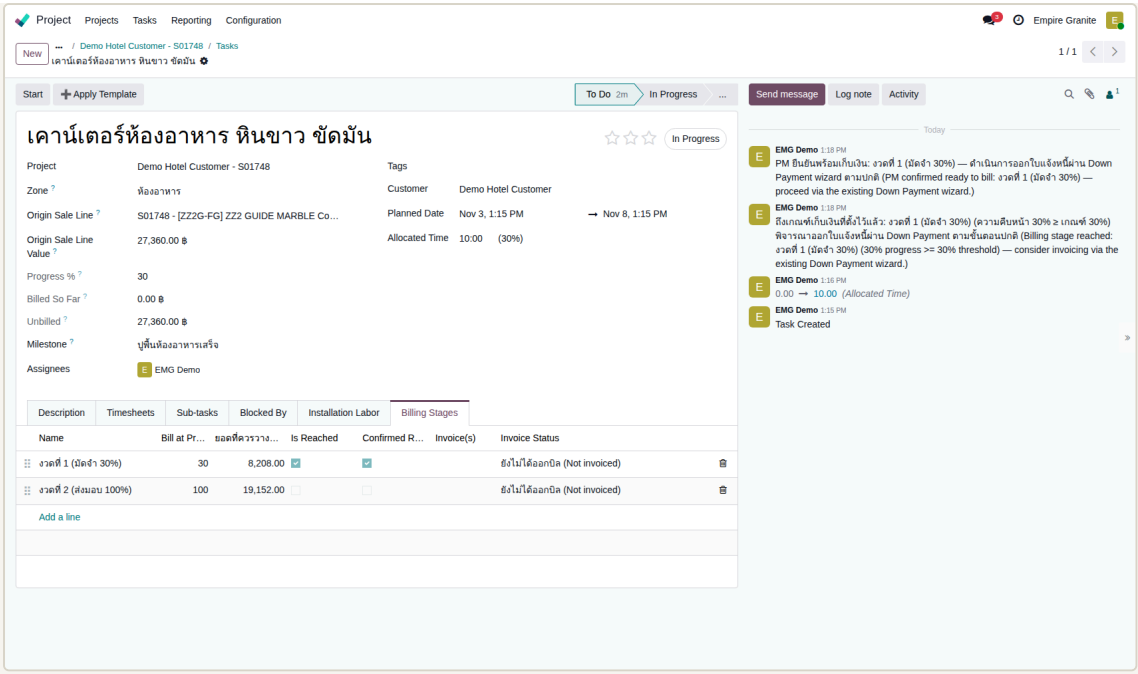


ตัวอย่างหน้าจอจริง: หลังกดยืนยันพร้อมเก็บเงิน (ข้อ 5.2)

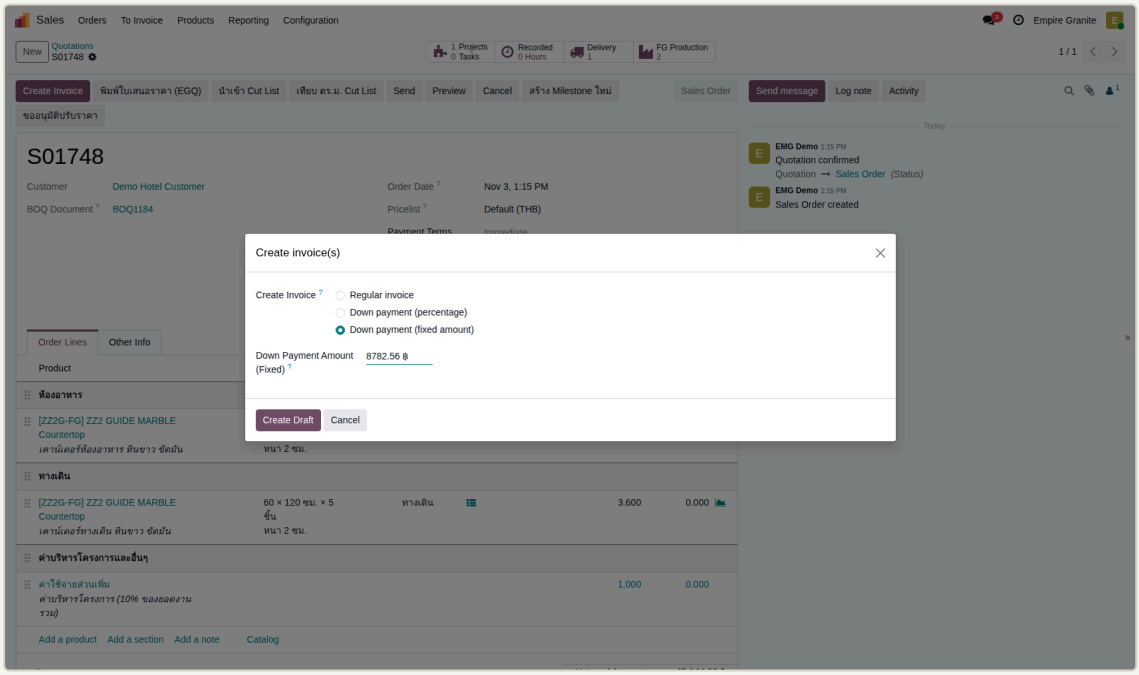


ตัวอย่างหน้าจอจริง: Down Payment 8,782.56 (ข้อ 5.3)

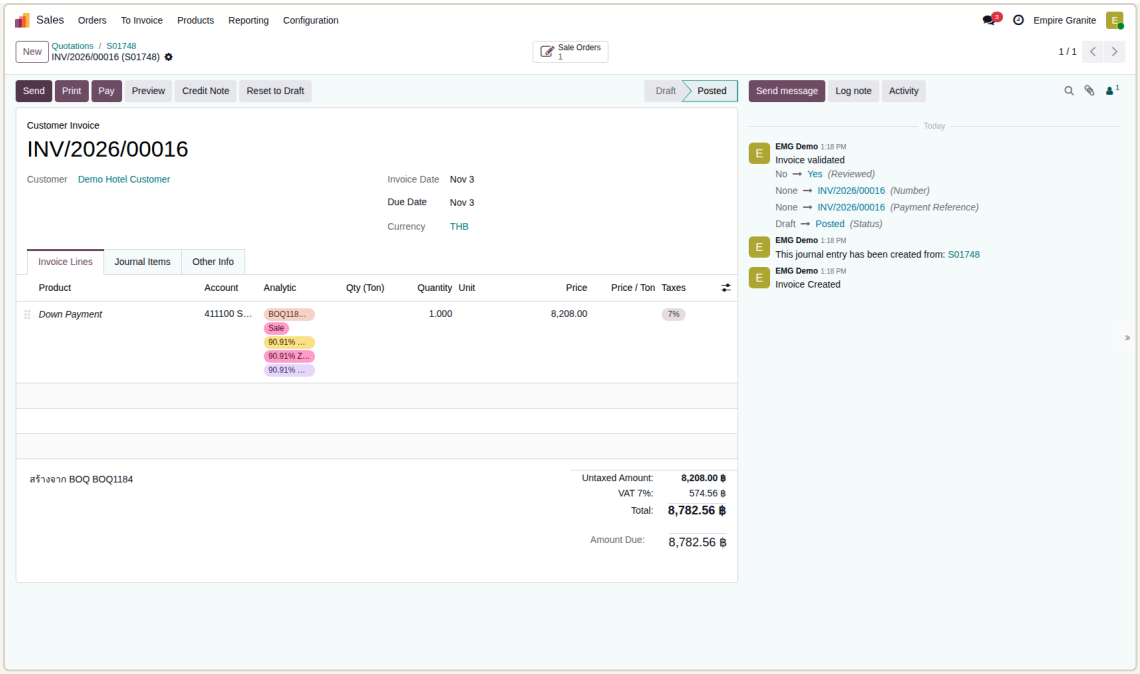


ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบแจ้งหนี้งวดแรก (ข้อ 5.3)

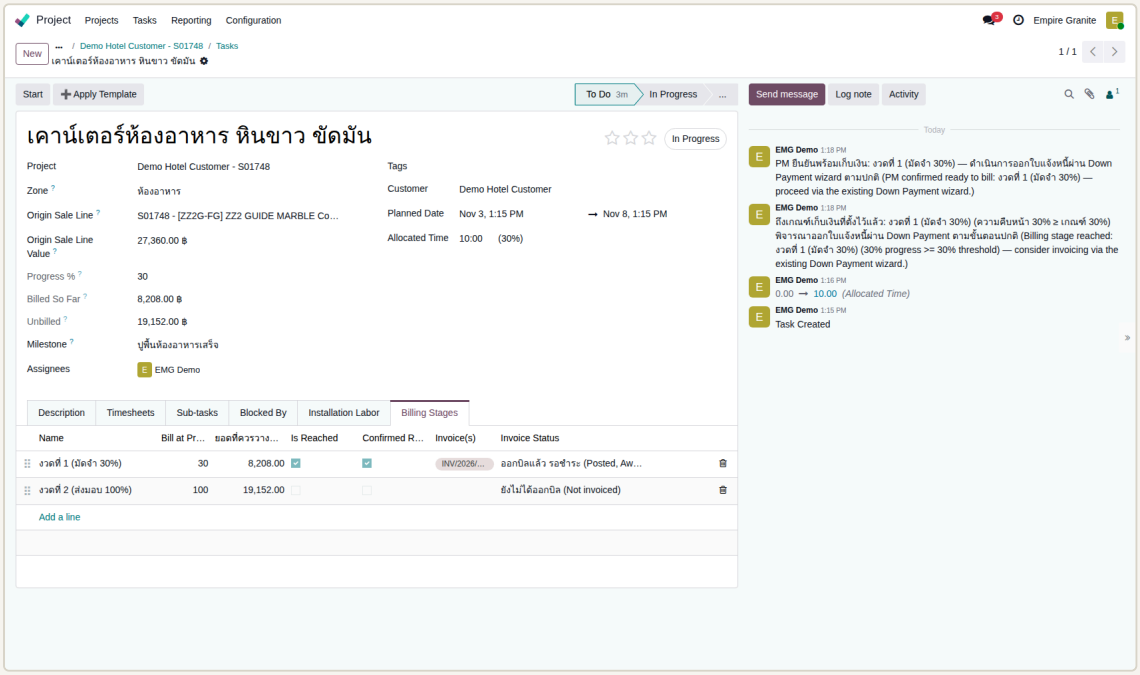

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ผูกใบแจ้งหนี้กับงวด (ข้อ 5.4)

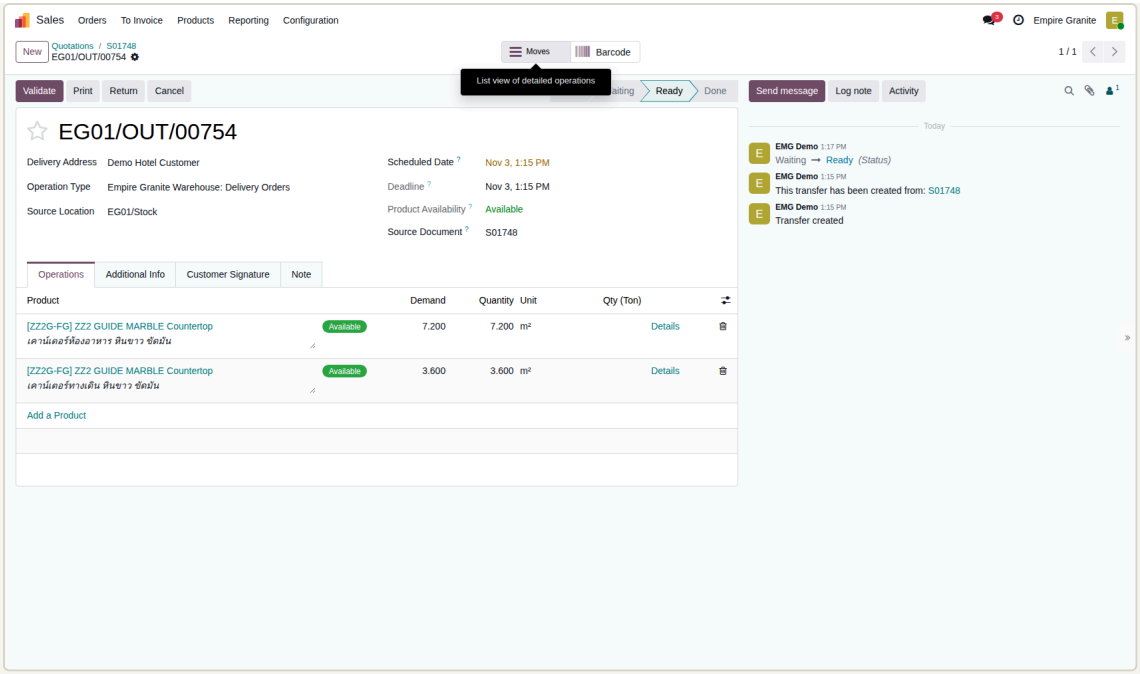

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบส่งของที่ Ready (ข้อ 5.5)

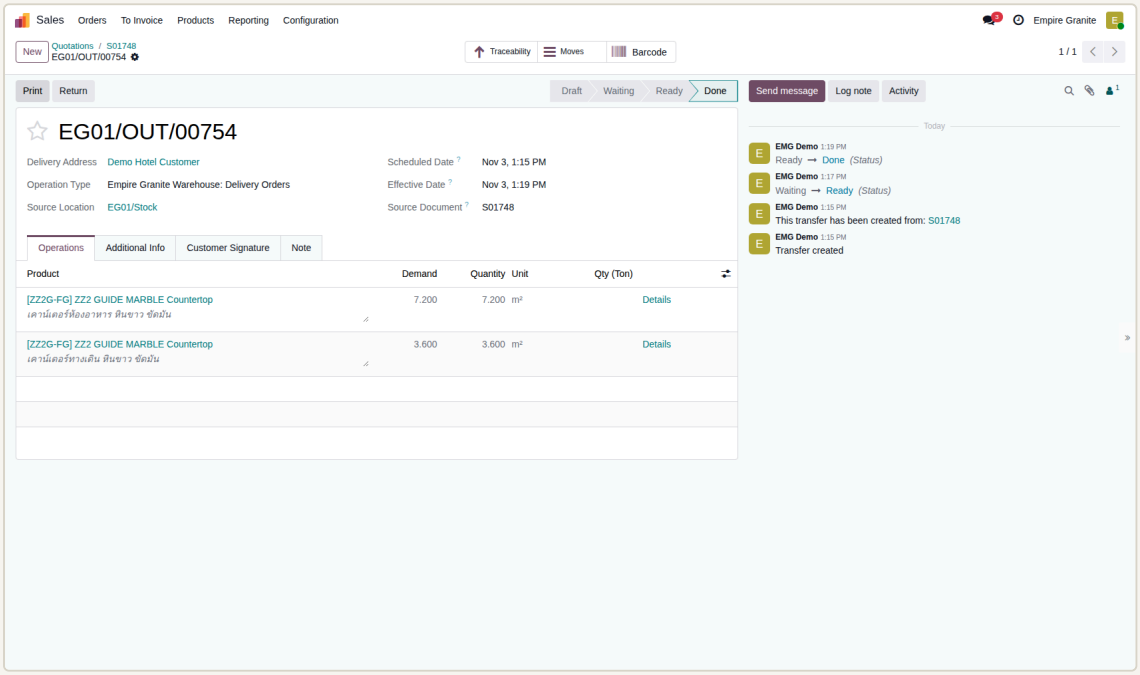


ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบส่งของที่ Done (ข้อ 5.5)


[06]

ตอน 6 · งานติดตั้ง ปิดงาน และ Milestone


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
6.1	Task ห้องอาหาร แท็บ Timesheets เพิ่มบรรทัด **ปูพื้นห้องอาหาร วันที่ 2-3** · ชั่วโมง **7** แล้ว Save จากนั้นแท็บ Billing Stages กด **ยืนยันพร้อมเก็บเงิน** ที่งวดที่ 2	รวม 3 + 7 = 10 ชั่วโมง = 100% งวดที่ 2 ถึงเกณฑ์	Progress % **100** · งวดที่ 2: Is Reached ✓ แล้ว Confirmed Ready to Bill ✓
6.2	แท็บ **Installation Labor** ช่อง วันติดตั้งจริง พิมพ์ **2** แล้ว Save จากนั้นกด **บันทึกค่าแรงติดตั้ง**	ใช้เฉพาะพนักงานบริษัทเองไปติดตั้งหน้างาน (จ่ายเป็นเงินเดือน ไม่มีบิลจากใคร) · ระบบคูณวันกับอัตราต่อวันที่ตั้งไว้ที่บริษัท (1,200) แล้วลงเป็นต้นทุนประมาณการ เดบิต COGS - Site Installation Labor เครดิต Accrued Expenses · ลงได้ครั้งเดียวต่อ Task (ถ้าผิดมีปุ่ม แก้ไข/ยกเลิกรายการ)	Stone Install Labor Amount **2,400.00** (2 × 1,200) · หลังกดปุ่ม เปลี่ยนเป็น แก้ไข/ยกเลิกรายการ · ข้อความใน Chatter: บันทึกค่าแรงติดตั้งแล้ว 2 วัน x 1200 = 2400 บาท (JE MISC/2026/11/0029)
6.3	กดช่องสถานะ (วงกลมด้านขวาของชื่อ Task) เลือก **Done**	ปิด Task แล้ว Milestone ที่ผูกไว้ "ถึงเป้า" โดยอัตโนมัติ	สถานะ **Done** · Chatter: Task done (In Progress → Done) · Milestone **ปูพื้นห้องอาหารเสร็จ** ถึงเป้าแล้ว
6.4	เปิด Task ทางเดิน ใส่วันติดตั้งจริง **1** กด **บันทึกค่าแรงติดตั้ง** แล้วตั้งสถานะ **Done**	Task นี้ไม่ได้ตั้งงวดเก็บเงิน (เก็บในใบแจ้งหนี้สุดท้าย) จึงไม่ต้องลงเวลา	ค่าแรงติดตั้ง **1,200.00** (1 × 1,200) · Task Done · Milestone **ปูพื้นทางเดินเสร็จ** ถึงเป้า

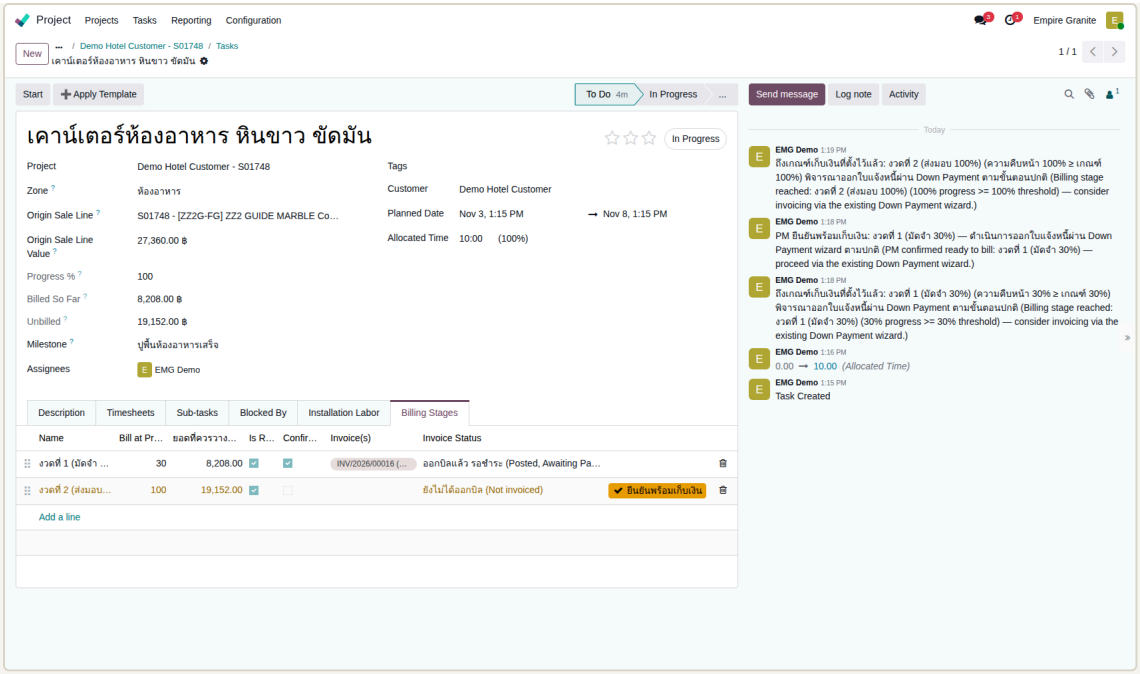


ตัวอย่างหน้าจอจริง: งวดที่ 2 ถึงเกณฑ์ 100% (ข้อ 6.1)

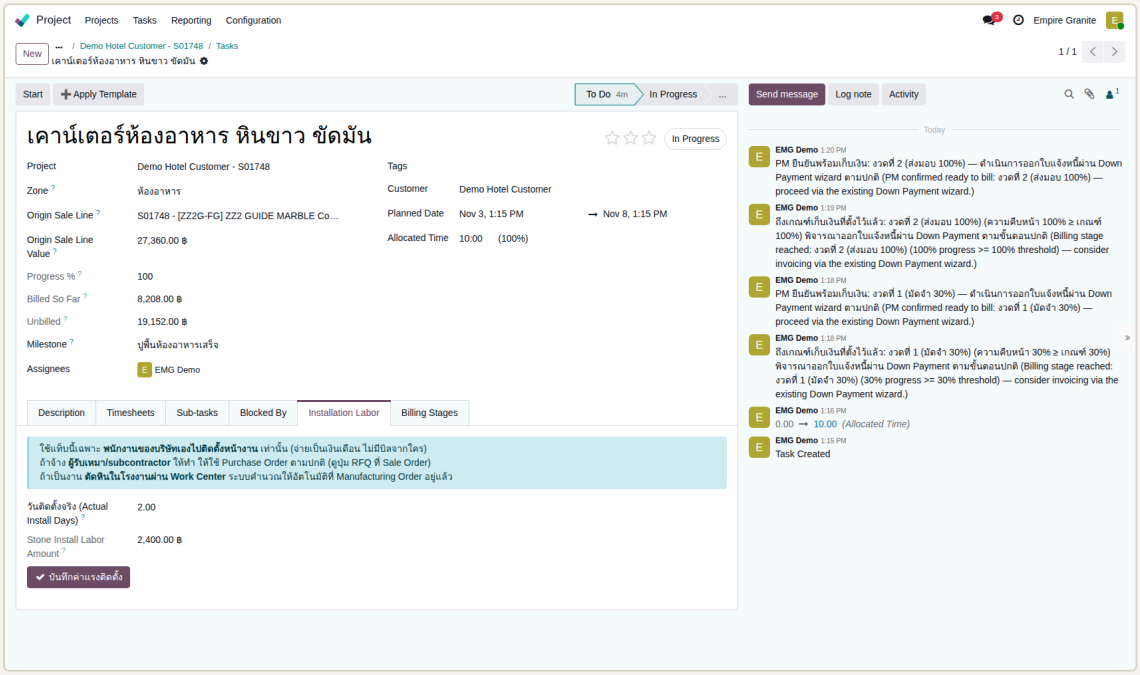


ตัวอย่างหน้าจอจริง: วันติดตั้งจริง 2 วัน (ข้อ 6.2)

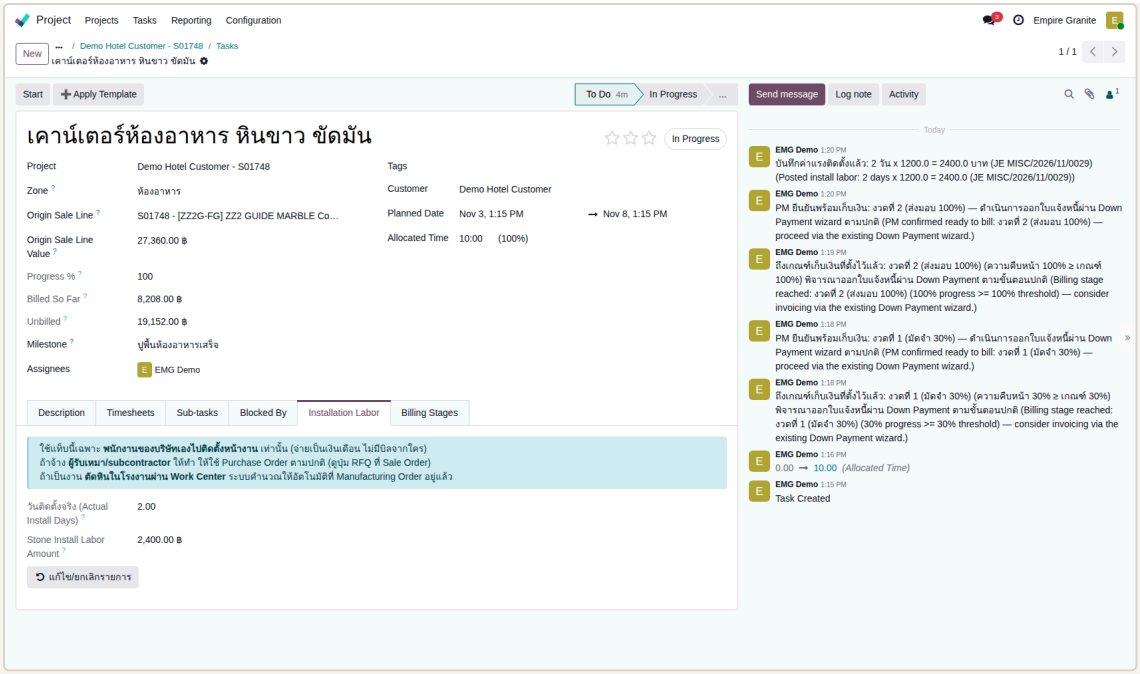

ตัวอย่างหน้าจอจริง: บันทึกค่าแรงติดตั้งแล้ว (ข้อ 6.2)

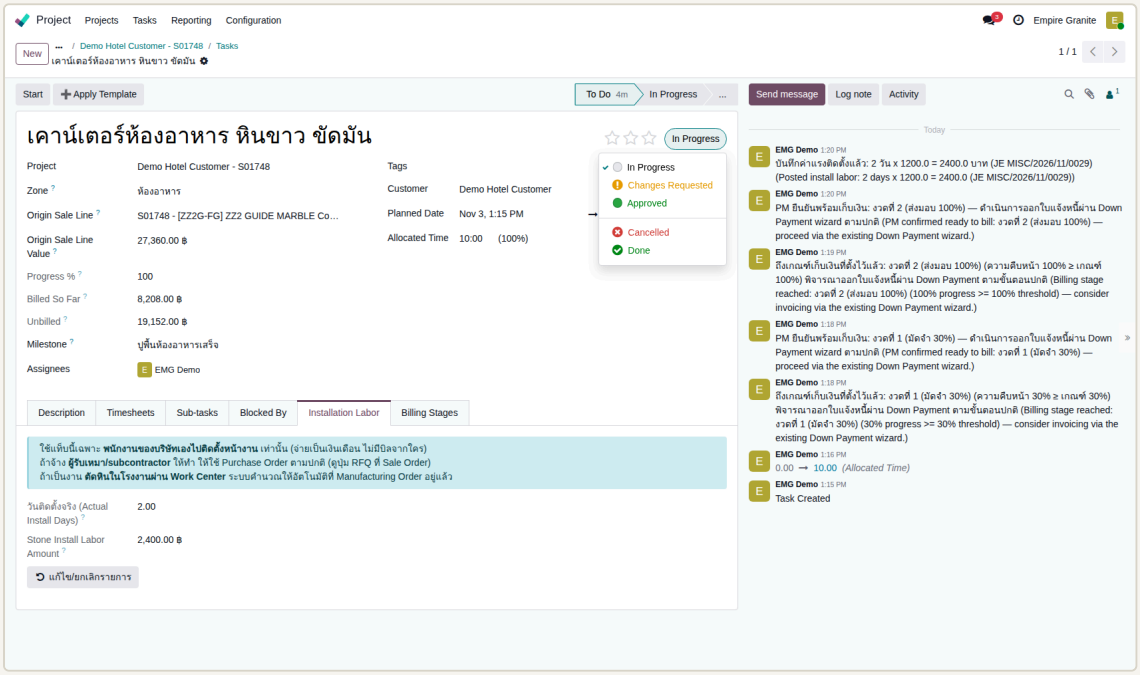

ตัวอย่างหน้าจอจริง: เมนูสถานะของ Task (ข้อ 6.3)

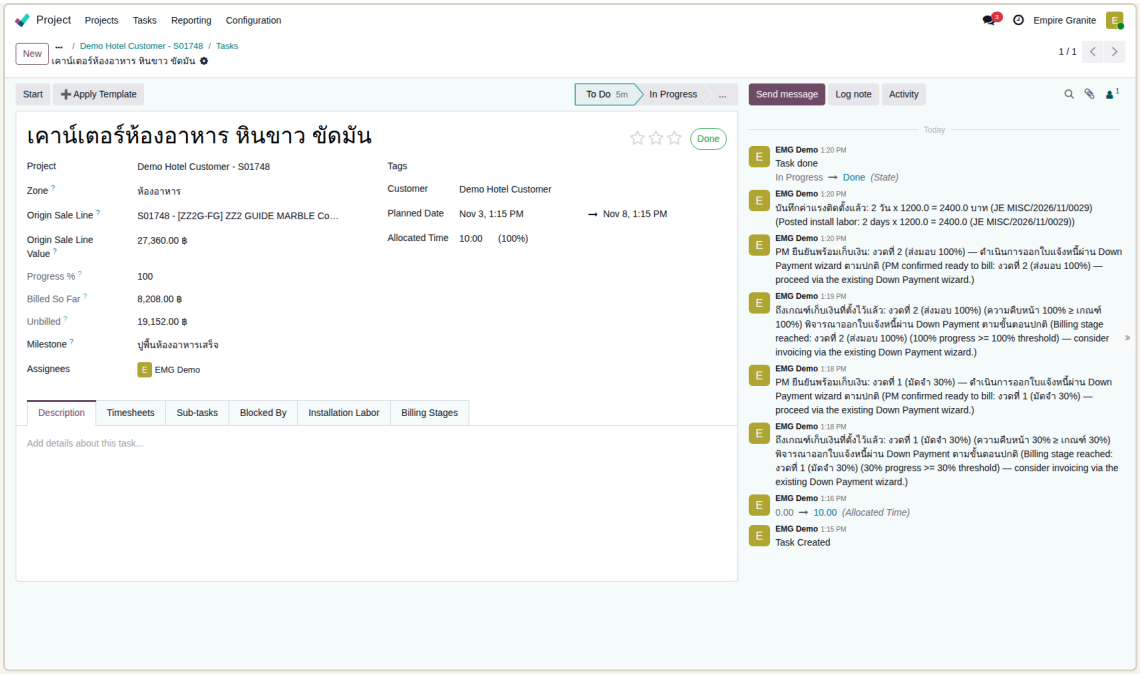


ตัวอย่างหน้าจอจริง: Task ที่ Done พร้อมประวัติใน Chatter (ข้อ 6.3)

[07]


ตอน 7 · ใบแจ้งหนี้สุดท้าย และกำไรของโปรเจกต์

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
7.1	ที่ใบสั่งขาย ดูแถบ Delivered / Invoiced แล้วกด **Create Invoice** เลือก **Regular invoice** กด Create Draft จากนั้นกด **Confirm**	ใบแจ้งหนี้สุดท้ายเก็บส่วนที่เหลือ ระบบหัก Down Payment ที่เก็บไปแล้วให้เอง	ใบแจ้งหนี้ (เช่น INV/2026/00017) **Posted** · ห้องอาหาร 7.200 · ทางเดิน 3.600 · ค่าบริหารโครงการ 4,104.00 · บรรทัดหัก **Down Payment −8,208.00** · ก่อน VAT **36,936.00** · VAT 2,585.52 · รวม **39,521.52**
7.2	กลับที่ Task ห้องอาหาร แท็บ Billing Stages ช่อง Invoice(s) ของงวดที่ 2 เลือกใบแจ้งหนี้สุดท้าย แล้ว Save	ผูกงวดสุดท้ายเข้ากับใบแจ้งหนี้ให้สถานะครบ	งวดที่ 1 และ 2 ขึ้น **ออกบิลแล้ว รอชำระ** ทั้งคู่


ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
7.3	เมนู **Accounting → Reporting → Profit and Loss** กดปุ่ม **Analytic** ช่องค้นหาพิมพ์ **BOQ1184** เลือก BOQ1184 - Demo Hotel Customer แล้วกดขยาย Revenue และ Less Costs of Revenue (ใช้เลข BOQ ของคุณ)	ติ๊ก Sold as Project ไว้ ต้นทุนและรายได้ของงานนี้จึงถูกแยกตามโปรเจกต์ ดูกำไรเฉพาะงานนี้ได้	คอลัมน์ BOQ1184: Revenue **45,144.00** · COGS - Stone Sales 12,223.68 · COGS - FG Production (Fabrication) 16,200.00 · COGS - Site Installation Labor **3,600.00** · Less Costs of Revenue **32,023.68** · Gross Profit **13,120.32** · คอลัมน์ Total ข้างๆ คือทุกงานรวมกัน (อย่าสับสน)

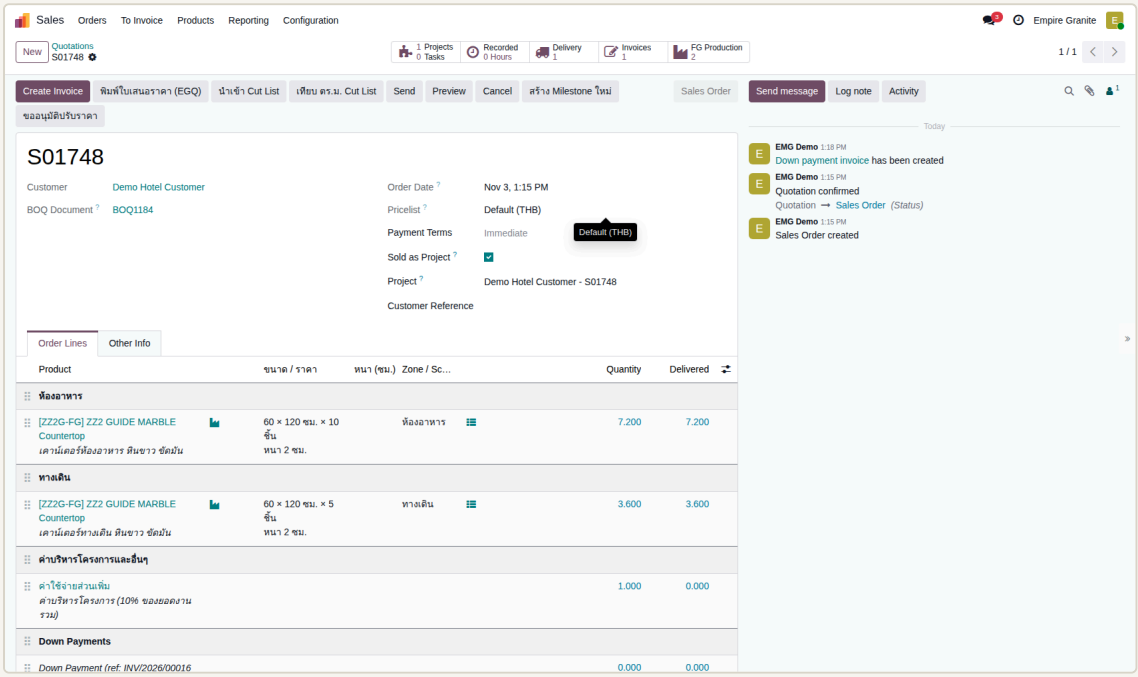


ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบสั่งขายก่อนออกใบแจ้งหนี้สุดท้าย (ข้อ 7.1)

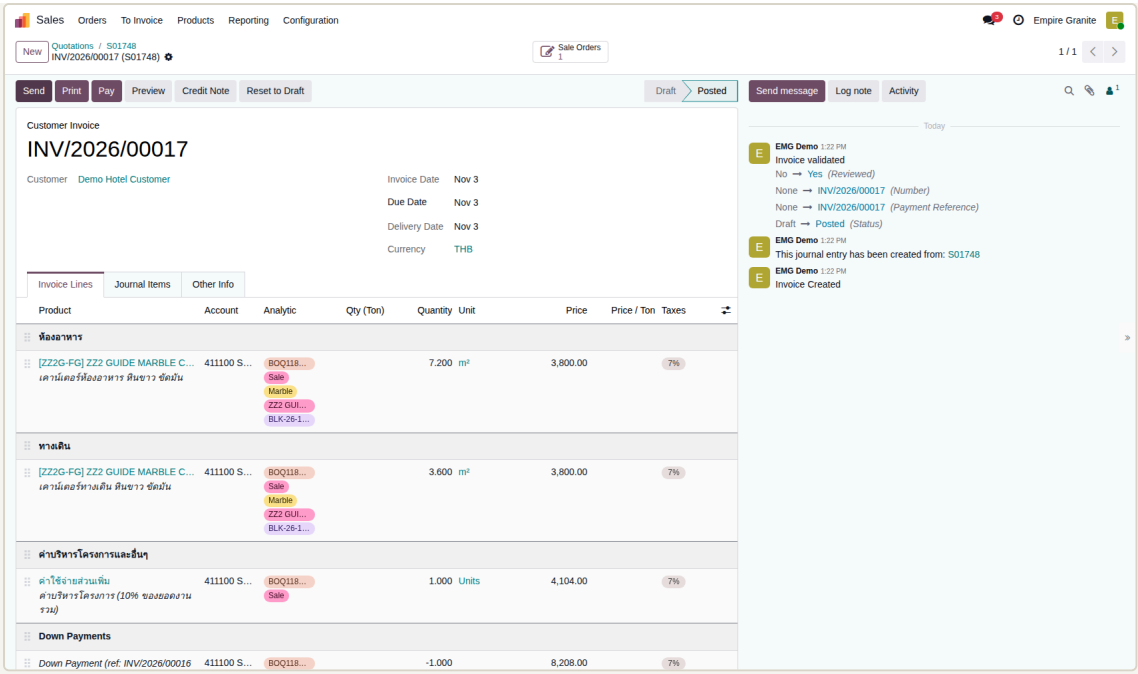

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ใบแจ้งหนี้สุดท้ายหัก Down Payment (ข้อ 7.1)

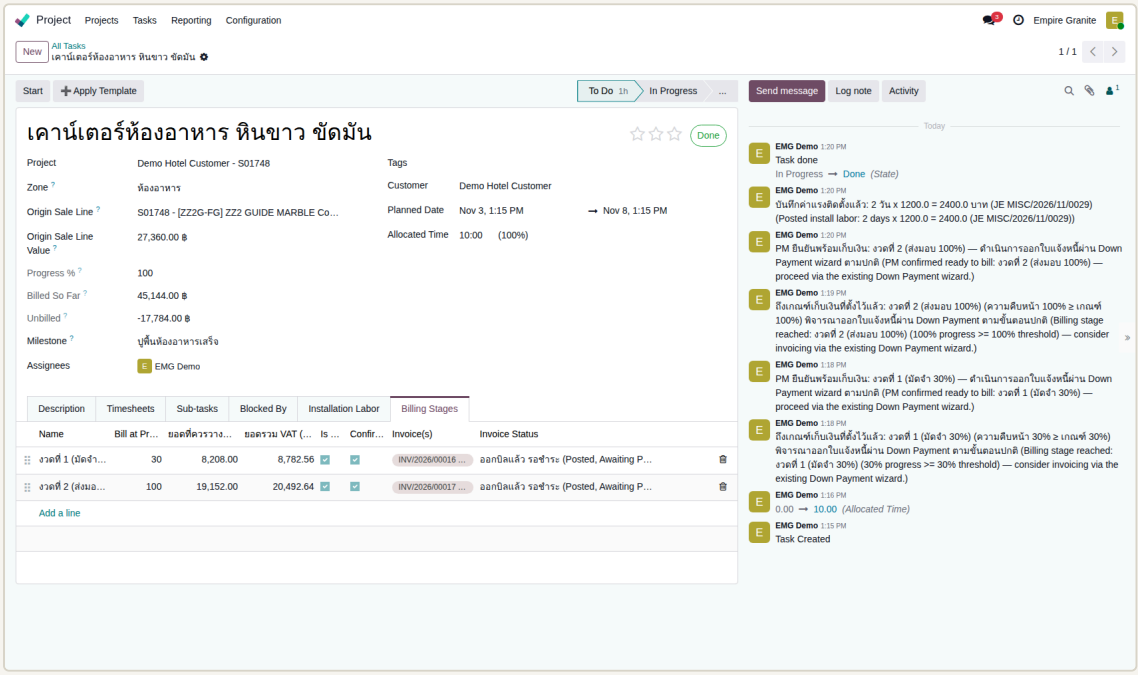

ตัวอย่างหน้าจอจริง: งวดเก็บเงินทั้งสองงวดผูกใบแจ้งหนี้แล้ว (ข้อ 7.2)

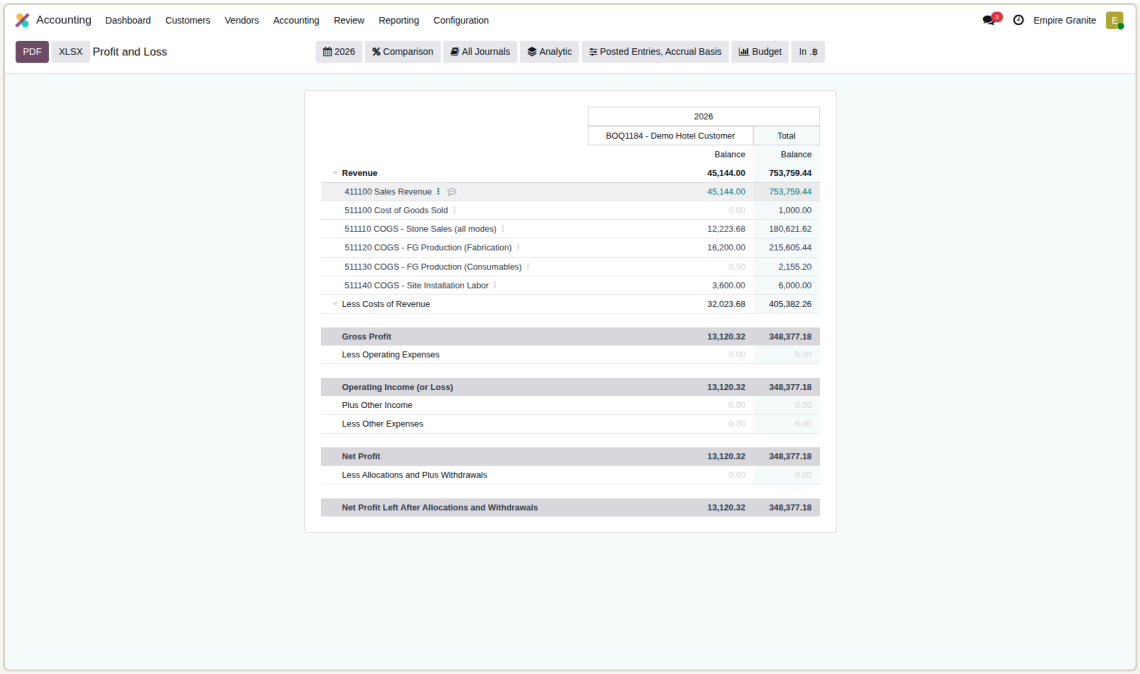

	2026	
	BOQ1184 - Demo Hotel Customer	Total
	Balance	Balance
Revenue	**45,144.00**	**753,759.44**
411100 Sales Revenue	45,144.00	753,759.44
511100 Cost of Goods Sold	0.00	1,000.00
511110 COGS - Stone Sales (all modes)	12,223.68	180,621.62
511120 COGS - FG Production (Fabrication)	16,200.00	215,605.44
511130 COGS - FG Production (Consumables)	0.00	2,155.20
511140 COGS - Site Installation Labor	3,600.00	6,000.00
Less Costs of Revenue	32,023.68	405,382.26
Gross Profit	**13,120.32**	**348,377.18**
Less Operating Expenses	0.00	0.00
Operating Income (or Loss)	**13,120.32**	**348,377.18**
Plus Other Income	0.00	0.00
Less Other Expenses	0.00	0.00
Net Profit	**13,120.32**	**348,377.18**
Less Allocations and Plus Withdrawals	0.00	0.00
Net Profit Left After Allocations and Withdrawals	**13,120.32**	**348,377.18**

ตัวอย่างหน้าจอจริง: P&L ของโปรเจกต์ (ข้อ 7.3)

ตัวเลขตรวจจ่าย: เก็บเงินสองงวด 8,782.56 + 39,521.52 = **48,304.08** = ยอดใบเสนอราคารวม VAT · ก่อน VAT 8,208.00 + 36,936.00 = 45,144.00 · ต้นทุน 12,223.68 + 16,200.00 + 3,600.00 = **32,023.68** (Slab นับครั้งเดียว) · กำไร 45,144.00 − 32,023.68 = **13,120.32**

[08]

ข้อควรรู้

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อมูลที่สร้างจากคู่มือนี้	BOQ 1 ใบ · ใบสั่งขาย 1 ใบ · Project 1 โปรเจกต์ (Task 2, Milestone 2) · ใบสั่งผลิต 2 ใบ (ใช้ Slab 3 แผ่น) · ใบส่งของ 1 ใบ · ใบแจ้งหนี้ 2 ใบ · รายการบัญชีค่าแรงติดตั้ง 2 รายการ · ไม่ต้องลบทิ้ง
ติ๊ก Sold as Project ก่อน Confirm	ถ้าลืม จะไม่ได้ Project และ Task · การติ๊กหลังยืนยันแล้วยังไม่ได้ทดลอง ให้ติ๊กก่อน Confirm เสมอ
ใบแจ้งหนี้งวดเป็นยอดรวม VAT	กรอก Down Payment ตามคอลัมน์ ยอดรวม VAT ของงวด (ข้อ 5.3) · ระบบไม่ผูกใบแจ้งหนี้กับงวดให้เอง ต้องเลือกที่ช่อง Invoice(s) เอง (ข้อ 5.4)
อย่านับค่าแรงติดตั้งซ้ำ	ถ้าใช้ชุดค่าแรงติดตั้งใน BOQ (เส้นทาง 3) แล้วบันทึกค่าแรงติดตั้งที่ Task ด้วย ค่าแรงจะลงต้นทุนสองครั้ง เลือกวิธีเดียวต่องาน
กรอกฟอร์มแบบทีละช่อง	แถวแก้ไขได้ในฟอร์ม BOQ ให้คลิกทีละช่องแล้วพิมพ์ อย่ากด Enter หรือ Tab ข้ามช่อง
ที่ยังไม่อยู่ในคู่มือนี้	Apply Template (ชุด Sub-task) · ผู้รับเหมาช่วงด้วย Purchase Order · สร้าง Task จาก BOQ ก่อนมีใบเสนอราคา · เชื่อมกับ Project เดิมที่มีอยู่ · Task หลายใบต่อบรรทัด · ชั่วโมงเกินที่ตั้งไว้ (แจ้งเตือน) · รับชำระเงินงวด

เรื่อง	รายละเอียด
ถ้าเจอปัญหา	ส่งภาพหน้าจอ พร้อมบอกว่าอยู่ข้อไหน

บันทึกของผู้ใช้งาน
